

山ノ井法善寺線道路整備事業

1. 概要

本路線は、柏原市立堅下北小学校区の通学路に指定されており、歩行空間を確保することで、通学する児童の安全の確保が図られる。また、堅下駅・法善寺駅周辺地区バリアフリー基本構想における生活関連道路として、バリアフリー空間の確保を図る。

本工事は、二期にわたって実施し、令和7年度完了予定である。

事業区間	：	柏原市法善寺4丁目地内
事業主体	：	柏原市
事業内容	：	歩道設置 L=440m、W=8.5m
事業着手年度	：	令和4年度（計画事業期間：令和4年度～令和7年度）
進捗状況	：	（令和7年3月末時点）
用地買収率	：	100.0%（用地買収面積比率）
工事進捗率	：	69.2%（工事費比率）
事業費進捗率	：	65.3%

2. 当該年度事業内容

令和7年事業予定内容：歩道設置工事（第二期区間） L=220m、支援業務、道路台帳整備


3. 位置図等



平面図



4. 標準断面

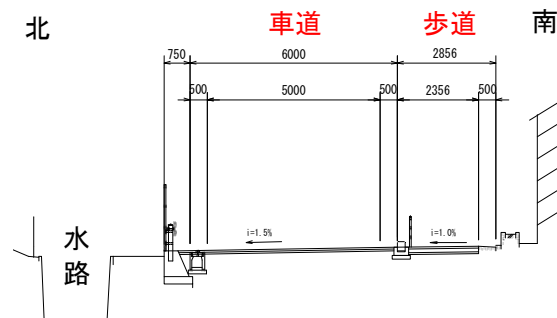

5. 現場写真等

第一期区間

工事着手前



工事完了後



第二期区間

工事着手前



進捗状況

